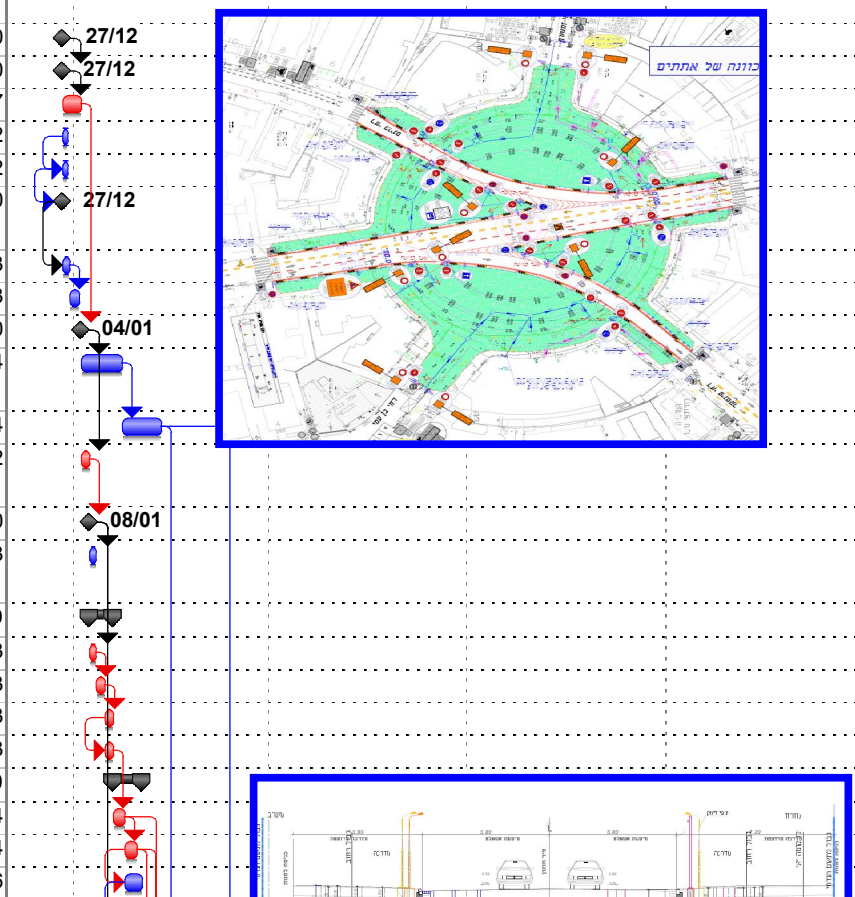


מזהה	שם פעילות	משך	2017											
			רבעון ראשון			רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי		
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב
1	כיכר דיזנגוף פיתוח תשתיות בניה ופיתוח	276 ימים												
2	אבן דרך שלב א (חצי מעגל תנועה בכיכר צד מערב)	86 ימים												
3	התארגנות לתחילת עבודות	35 ימים												
4	צו התחלת עבודה	0 ימים												
5	פגישת התנועה לתחילת עבודות עם קבלן זוכה	0 ימים												
6	הליך קבלת רישיון ותאומים מקדמיים	7 ימים												
7	מסירת סימון אתר בין מודדים	2 ימים												
8	מינוי צוות קבלני כולל חברת אבטחה לאביזרי תנועה וקבלני משנה	2 ימים												
9	העברת שטח אתר עבודה כולל גדרות והסדרי תנועה קיימים תאורה זמנית חלקית ובהתאם למפרט להמשך אחזקה וטיפול	0 ימים												
10	הקמת שטח התארגנות, משרד מינהלת ושלט אתר	3 ימים												
11	תאום חיבור חשמל זמני, חיבור מים זמני	3 ימים												
12	חלוקת מישורים	0 ימים												
13	הכנת משטח דוגמאות לריצופים מדרכות, ומוצרים כנ"ל גם לכיכר באופן מושלם ואישור תקינות	14 ימים												
14	אישור דוגמאות אדריכל העיר שפע דרכים ומאור	14 ימים												
15	קבלת רישיון עבודה זמני והצבת תמרורים כולל הסטת ציר אוטובוסים נוהל אדדום לבן וכד	2 ימים												
16	קבלת רישיון עבודה סופי ותחילת עבודות בפועל בשטח	0 ימים												
17	תליית קווים זמניים וטיפול בקיימים, רמזורים, מים, תאורה, הגנות עצים ועמודי חשמל וכד'.	3 ימים												
18	רחוב פינסקר - תשתית מאספת לכיכר	9 ימים												
19	ביוב	3 ימים												
20	תיעול	3 ימים												
21	מים	3 ימים												
22	הקדמת שרואי חשמל, רמזורים, השקיה, תאורה ושרואי הכנה אחרים	3 ימים												
23	רחוב ריינס - תשתית מאספת לכיכר	10 ימים												
24	ביוב	4 ימים												
25	תיעול	4 ימים												
26	מים	6 ימים												



זיכר דיזנגוף מרכז שלב ב נספח למכרז תאריך: 30/10/16	פעילות		פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות	
	פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרויקט	
	התקדמות		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל	
	אבן דרך		התקדמות מסתכמת		תאריך יעד	
	ערסל		פיצול			

מזהה	שם פעילות	משך	2017														
			רבעון ראשון				רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי				
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ		
27		הקדמת שרואלי חשמל , רמזורים , השקיה , תאורה ושרואלי הכנה אחרים	5 ימים														
28		<u>דיזנגוף קטע צפון- עד אסתר המלכה תשתית מאספת לכיכר</u>	13 ימים														
29		ביוב	5 ימים														
30		תיעול	3 ימים														
31		מים	5 ימים														
32		הקדמת שרואלי חשמל , רמזורים , השקיה , תאורה ושרואלי הכנה אחרים	4 ימים														
33		קידוח גמיש / חפירה לשרואלי הכנה לרמזורים וגל ירוק עד פרישמן .	5 ימים														
34		<u>דיזנגוף קטע דרום - עד בר כוכבא תשתיות מאספות לכיכר</u>	21 ימים														
35		ביוב	7 ימים														
36		תיעול	7 ימים														
37		מים	7 ימים														
38		הקדמת שרואלי חשמל , רמזורים , השקיה , תאורה ושרואלי הכנה אחרים	5 ימים														
39		קידוח גמיש / חפירה לשרואלי הכנה לרמזורים וגל ירוק עד טשרחניחבסקי .	5 ימים														
40		<u>ביצעו חצי מעגל מערבי - (בן עמי)</u>	77 ימים														
41		עבודות פירוקים,	2 ימים														
42		העתקת עץ פיקוס העתקה מלאה וביצוע בור שתילה מתאים לפי מפרט + ביצוע העתקות וועקירות עצים	7 ימים														
43		טיפול בתשתיות הקיימות, פיתרונות זמניים תאורה זמנית על בטונדות	3 ימים														
44		עבודות עפר - החלפת קרקע , מילוי והידוק ועבודות יישור כבישים מדרכות כיכר	5 ימים														
45		הנחת תשתית ניקוז	7 ימים														
46		הנחת תשתית ביוב	7 ימים														
47		הנחת תשתית מים	7 ימים														
48		עבודות תקשורת (בזק) וחברות הכבלים שרואלי והעתקות	3 ימים														
49		הקדמת שרואלי חשמל , רמזורים , השקיה , תאורה ושרואלי הכנה אחרים	7 ימים														
50		קבלת תיק תוכניות מ.ד ואישור חח"י לקבלן לעבודות אזוריות	4 ימים														
51		עבודות חברת תשתית הכנות לשרואלים של חח"י	7 ימים														


זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב נספח למכרז תאריך: 30/10/16	פעילות		פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות	
	פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרייקט	
	התקדמות		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל	
	אבן דרך		התקדמות מסתכמת		תאריך יעד	
	ערסל		פיצול			

מזהה	שם פעילות	משך	2017											
			רבעון ראשון				רבעון שני				רבעון שלישי			
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב
52	 עבודות השחלת כבילה מתח גבוה ונמוך לבניינים וארונות + שליפות .	4 ימים												
53	 עבודות אזרחיות כבילה בכניסות לבתים כולל שליפות ושיקום בתאום וועדים	4 ימים												
54	 עבודות דיפון למזרקה התת קרקעית	7 ימים												
55	 ביצוע הנחת צינורות איורור מחדר המזרקה בכביש	4 ימים												
56	 עבודות צורת דרך כבישים , שביל אופניים מדרכות	3 ימים												
57	 מצעים כבישים ושביל אופניים	2 ימים												
58	 עבודות אבני שפה כביש , שביל אופניים ועטרה כיכר וכו'	5 ימים												
59	 מצעים כביש שכבה אחרונה	3 ימים												
60	 עבודות סלילה 2 שכבות אספלט כביש תחתונות	2 ימים												
61	 עבודות אספלט שכבה ראשונה שביל אופניים	1 יום												
62	 עבודות תאורה מכל הסוגים (יציקת יסודות עמודי תאורה)	2 ימים												
63	 התקנת עמודי תאורה חדשים	5 ימים												
64	 עבודות תשתית מחישוב ומצלמות	2 ימים												
65	 עבודות הכנה ושרוולים לאורור לוח מודעות , שירותים עילים , מתקן אופניים , גז , הסנקה לחדר מזרקה	2 ימים												
66	 ביצוע בורות שתילה לעצים	7 ימים												
67	 עבודות שרוולים להשקייה לגיבון	3 ימים												
68	 ביצוע מצעים מדרכה לאחר צורת דרך ופינוי מטרדי וחיבור לעסקים	2 ימים												
69	 ביצוע ריצופים בקטעים לפי פרטי אדריכליים התאמות תאים .	20 ימים												
70	 ביצוע צמתים (תשתיות כולל מערכות ואספלט וריצופים)	7 ימים												
71	 ביצוע שיקום מצעים ריצופים פינסקר לאחר גמר עבודות	10 ימים												
72	 ביצוע שיקום מצעים ריצופים בן עמי לאחר גמר תשתיות	7 ימים												
73	אבן דרך שלב ב (חצי מעגל תנועה בכיכר צד מזרח)	96 ימים												
74	התארגנות לתחילת עבודות	3 ימים												
75	 חלוקת מישרים	0 ימים												
76	 קבלת רישיון עבודה זמני והצבת תמרורים כולל הסטת ציר אוטובוסים נוהל אדדום לבן וכד	1 יום												
77	 קבלת רישיון עבודה סופי ותחילת עבודות בפועל בשטח	1 יום												
78	 תליית קווים זמניים וטיפול בקיימים , רמזורים , מים , תאורה , הגנות עצים ועמודי חשמל וכד' .	2 ימים												
79	ביצוע חצי מעגל מזרחי - (זאמנהוף)	94 ימים												
זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב נספח למכרז תאריך: 30/10/16			פעילות מסתכמת פעילות קריטית מסתכמת אבן דרך מסתכמת התקדמות מסתכמת פיצול											
			פעילות חיצונית ערסל פרוייקט קבץ לפי ערסל תאריך יעד											
			פעילות חיצונית ערסל פרוייקט קבץ לפי ערסל תאריך יעד											
			פעילות חיצונית ערסל פרוייקט קבץ לפי ערסל תאריך יעד											
			פעילות חיצונית ערסל פרוייקט קבץ לפי ערסל תאריך יעד											

מזדה	שם פעילות	משך	2017													
			רבעון ראשון				רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי			
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ	
80		עבודות פירוקים,	2 ימים													
81		השלמת העתקת עץ פיקוס העתקה מלאה כולל הכנת בור שתילה + ביצוע העתקות וועקירות עצים	4 ימים													
82		טיפול בתשתיות הקיימות, פיתרונות זמניים תאורה זמנית על בטונדות	3 ימים													
83		עבודות עפר - החלפת קרקע , מילוי והידוק ועבודות יישור כבישים מדרכות כיכר	4 ימים													
84		הנחת תשתית ניקוז	7 ימים													
85		הנחת תשתית ביוב	6 ימים													
86		הנחת תשתית מים	7 ימים													
87		עבודות תקשורת (בזק) חברות הכבלים שרוולי והעתקות	4 ימים													
88		עבודות שרוולים בחציית כבישים לכל התשתיות תאורה , השקייה , רמזורים , גל ירוק , מיחשוב וכד'	4 ימים													
89		קבלת תיק תוכניות מ.ד ואישור חח" לקבלן לעבודות אזרחיות	3 ימים													
90		עבודות חברת תשתית הכנות לשרוולים של חח"	4 ימים													
91		עבודות השחלת כבילה מתח גבוה ונמוך לבנינים וארונות + שליפות .	3 ימים													
92		עבודות אזרחיות כבילה בכניסות לבתים כולל שליפות ושיקום בתאום וועדים	3 ימים													
93		עבודות צורת דרך כבישים , שביל אופניים מדרכות	0 ימים													
94		מצעים כבישים ושביל אופניים	2 ימים													
95		עבודות אבני שפה כביש , שביל אופניים ועטרה כיכר וכו'	3 ימים													
96		מצעים שכבה אחרונה	2 ימים													
97		עבודות סלילה 2 שכבות אספלט כביש תחתונות	2 ימים													
98		עבודות אספלט שכבה ראשונה שביל אופניים	1 יום													
99		עבודות תאורה מכל הסוגים (יציקת יסודות עמודי תאורה)	3 ימים													
100		התקנת עמודי תאורה חדשים	7 ימים													
101		עבודות תשתית מחישוב ומצלמות	3 ימים													
102		עבודות הכנה ושרוולים לאזור לוח מודעות , שירותים עילים , מתקן אופניים וכד'	3 ימים													
103		ביצוע בורות שתילה לעצים	7 ימים													
104		עבודות שרוולים להשקייה לגינן	3 ימים													
105		ביצוע מצעים לאחר צורת דרך ופינוי מטרדי וחבור לעסקים	2 ימים													
106		ביצוע ריצופים בקטעים לפי פרטי אדריכליים התאמות תאים .	20 ימים													

זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב' נספח למכרז תאריך: 30/10/16	פעילות		פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות	
	פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרוייקט	
	התקדמות		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל	
	אבן דרך		התקדמות מסתכמת		תאריך יעד	
	ערסל		פיצול			
עמוד 4						





מזהה	שם פעילות	משך	2017											
			רבעון ראשון			רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי		
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב
107		4 ימים												
108		10 ימים												
109		10 ימים												
110	<u>אבן דרך שלב ג - הורדת רשת חח"י לתת"ק וחישמול למבנים</u>	33 ימים												
111	<u>פתיחת פסקים והשחלת כבלי חשמל ברחובות ובכיכר לכלל הפרוייקט לפי שלבי ביצוע שיקום והחזרת המצב כחדש .</u>	16 ימים												
112		3 ימים												
113		3 ימים												
114		3 ימים												
115		3 ימים												
116		4 ימים												
117		4 ימים												
118	<u>עבודות רשת וחישמול בתים והתברות לתחנות ופירוק רשת עילית</u>	17 ימים												
119		3 ימים												
120		3 ימים												
121		2 ימים												
122		4 ימים												
123		5 ימים												
124	<u>חיבורי מת"נ ומ"ג צרכנים ציבוריים חדשים</u>	13 ימים												
125		2 ימים												
126		2 ימים												
127		3 ימים												
128		3 ימים												
129		3 ימים												
130	<u>אבן דרך שלב ד - השלמת הקמת חדר המזרקה ופיתוח סופי לפרויקט (מעגל פנימי)</u>	185 ימים												
131	<u>התארגנות לתחילת עבודות</u>	2 ימים												
132		1 יום												
133		1 יום												

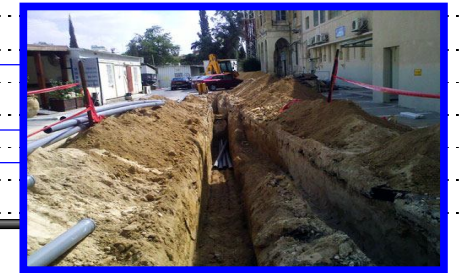

זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב נספח למכרז תאריך: 30/10/16	פעילות		פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות	
	פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרוייקט	
	התקדמות		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל	
	אבן דרך		התקדמות מסתכמת		תאריך יעד	
	ערסל		פיצול			

מזהה	שם פעילות	משך	2017											
			רבעון ראשון			רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי		
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב
134	 ביצוע בנית חדר מזרקה וחדרים טכניים תת"ק ופיתוח מעגל פנימי	185 ימים												
135	עבודות הכנה	1 יום												
136	עבודות פירוקים,	1 יום												
137	טיפול בתשתיות הקיימות, פיתרונות זמניים תאורה זמנית על בטונדות	1 יום												
138	בניית החדר התת קרקעי על ציודיו והתקנת פסל אגם	169 ימים												
139	בודות בטונים איטום , הארקה ותשתיות הכנה למבנה חדרים טכניים	130 ימים												
140	הצגת דוגמאות לאישור ציוד ואביזרים ותגמירים	20 ימים												
141	אישור דוגמאות ותגמירים	20 ימים												
142	עבודות חפירה לאחר עבודות דיפון	2 ימים												
143	ביצוע עבודות ביסוס בכלונסאות	5 ימים												
144	ביצוע עבודות ראשי כלונס	3 ימים												
145	ביצוע עבודות תשתיות תבראה חשמל הכנות והכנות אחרות .	2 ימים												
146	ביצוע עבודות איטום	1 יום												
147	ביצוע ריצפת בטון לחדר והמסדרון התת קרקעי	7 ימים												
148	ביצוע קירות בטון	10 ימים												
149	ביצוע עבודות תקרת בינים פודס מדרגות חדר טכני חח"י וחשמל ותאורה	7 ימים												
150	ביצוע יציקת קירות מאגר המים למזרקה	2 ימים												
151	השלמת קורות ותקרה פלנום ראשונה למזרקה כולל תשתיות הכנה	4 ימים												
152	השלמת קירות , מחיצות ומדרגות מבטון	4 ימים												
153	ביצוע תיקרת מזרקה ב- 2 שלבים כולל מערכות איטום ותשתיות מזרקה	12 ימים												
154	ביצוע מערכות איטום קירות ותיקרה כולל הגנות על האיטום	3 ימים												
155	עבודות מילוי והידוק סביב החדר התת קרקעי והכיכר כולל הידוקים בבקרה מלאה	4 ימים												
156	ביצוע יציקת ספסל המזרקה ויציקות משמלימות שונות כולל איטום	5 ימים												
157	ביצוע עבודות כלנסאות לריצפת הכיכר כולה	5 ימים												
158	עבודות גמר ותשתית פנים המזרקה וחדרים הטכניים .	53 ימים												
זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב נספח למכרז תאריך: 30/10/16			פעילויות חיצוניות											
			פעילות קריטית											
			התקדמות											
			אבן דרך											
			ערסל											
			פעילות מסתכמת											
			פעילות קריטית מסתכמת											
			אבן דרך מסתכמת											
			התקדמות מסתכמת											
			פיצול											

מזהה	שם פעילות	משך	2017											
			רבעון ראשון			רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי		
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב
159	ביצוע עבודות מסגרות פנים / חוץ	4 ימים												
160	ביצוע עבודות חשמל תקשורת בקרה	7 ימים												
161	הצגת תוכנית יצרן לוחות ואישור לאחר תיקון ליצור	14 ימים												
162	ביצוע עבודות אינטליגנציה וצנרות, הכנות לגז, מיזוג איוורור, מתח נמוך וכד'	7 ימים												
163	עבודת גמר ריצפה כולל איטום וחיפויים קירות ומאגר	5 ימים												
164	טיח תיקרה וקירות	4 ימים												
165	ביצוע מערכות שונות לפסל ומסגרות לביסוס הפסל והמנועים	7 ימים												
166	התקנת מערכות המיזרקה	20 ימים												
167	מערכות ספריקלרים ופרי אקשן ומערכות בטיחות	4 ימים												
168	ביצוע מערכות גז	3 ימים												
169	מערכת איוורור מיזוג	4 ימים												
170	מערכות גמל מים שעונים ומשאבות וניקוז	4 ימים												
171	חיבורי קצה למזרקה כולל מערכת אוסמוזה הפוכה	7 ימים												
172	ביצוע פנל כבאיים, גנרטור וצידיו	4 ימים												
173	התקנת ארונות חשמל, מרכזיה, וכל הארונות למתקנים השונים	7 ימים												
174	השלמת חדר בקרה, מערכות גילוי מערכות ביטחון ומצלצות	7 ימים												
175	מערכות מדיה ומערכות בקרה שליטה וקול שמע למזרקה	5 ימים												
176	השלמת מערכות לדלת הפנאומטיים בפיתוח	5 ימים												
177	השלמת דלתות חלונות, מעקות לדלות אש, סימוני בטיחות מטפים גלגלונים	4 ימים												
178	עבודות הפסל והצירה על מערכות	23 ימים												
179	ניתוק הפסל מהשטח הזמני, העברתו והתקנתו בשטח האתר	2 ימים												
180	ביצוע התקנת מנועים וחיבור למערכות המזרקה	4 ימים												
181	ביצוע התקנת משולשים לאחר הבאתם ממצבעה	10 ימים												
182	ביצוע הפעלה ראשונית והרצה לפסל	7 ימים												
183	עבודות פיתוח לכיכר	55 ימים												
184	ביצוע עבודות הצובר גז כולל תשתיות חיבור	5 ימים												
185	הנחת תשתית ניקוז	2 ימים												
186	הנחת תשתית ביוב	2 ימים												

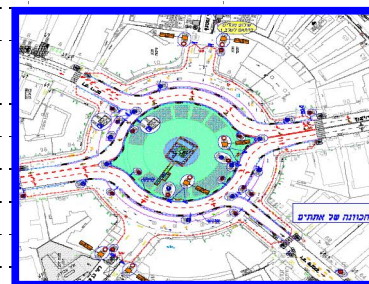

זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב נספח למכרז
תאריך: 30/10/16

פעילות
פעילות קריטית
התקדמות
אבן דרך
ערסל

פעילות מסתכמת
פעילות קריטית מסתכמת
אבן דרך מסתכמת
התקדמות מסתכמת
פיצול











פעילויות חיצוניות
ערסל פרויקט
קבץ לפי ערסל
תאריך יעד

פעילויות חיצוניות
ערסל פרויקט
קבץ לפי ערסל
תאריך יעד

מזהה	שם פעילות	משך	2017												
			רבעון ראשון				רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי		
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
187	הנחת תשתית מים	2 ימים													
188	ביצוע עבודות תקשורת	2 ימים													
189	שרוולים לעמודי רמזורים	2 ימים													
190	ביצוע עבודות הכנה לחברת חשמל למזרקה	2 ימים													
191	ביצוע השחלה כבילה וחיבור לארונות חשמל בחדר המזרקה	2 ימים													
192	ביצוע עבודות תשתית תאורה	2 ימים													
193	הכנות להשקייה	3 ימים													
194	תשתיות מחישוב לתקשורת מצלמות , רמקולים לעמודים , לשבשת מזרקה	3 ימים													
195	תשתיות לשילוט	2 ימים													
196	תשתיות לבולדרים " מחסומים פניאומטיים .	2 ימים													
197	תשתיות ל- POPUP מתקן לאירועים	2 ימים													
198	עבודות הידוק שתיית לכיכר .	2 ימים													
199	עבודות מצעים בשכבות לכלל הכיכר	3 ימים													
200	ביצוע עבודות ריצפת בטון לכלל הכיכר כולל תפרי התפשטות	7 ימים													
201	השלמות בטון של אבני צד אלמנטי בטון שונים	6 ימים													
202	ביצוע בורות שתילה לעצים לפי מפרט מיוחד	7 ימים													
203	ביצוע עבודות אדמת גן וטוף בחלקי הגיבון	2 ימים													
204	השלמת מתקני קצה של " הבולדרים " מחסומים פנאומטיים .	2 ימים													
205	כנ"ל עבור POPUP לאירועים	2 ימים													
206	השלמת מכסה פניאומטי על ציודיו לחדר הטכני והמזרקה .	2 ימים													
207	פוי חיפוי בטרצו או בטון אדריכלי בהתאם למאושר , כולל סרגלים תפרים	20 ימים													
208	השלמת ציוד קצה לבריכת המזרקה , גטים , תאורת פסל וייתר הציוד .	4 ימים													
209	ביצוע ציפוי מזרקה וספסל פסיפס או אחר בהתאם לפרט המיוחד	14 ימים													
210	השלמת עמודי תאורה	7 ימים													
211	השלמת עמודי רמזור על ציודיהם	4 ימים													
212	השלמת ציוד לעמודי התאורה , פנסים , רמקולים , מצלמות , שבשבות , WIFI , תאורה דקורטיבית	4 ימים													
213	ביצוע פרטי נגישות	5 ימים													
214	ריהוט ואביזרים משלימים	5 ימים													



זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב נספח למכרז תאריך: 30/10/16	פעילות		פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות	
	פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרוייקט	
	התקדמות		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל	
	אבן דרך		התקדמות מסתכמת		תאריך יעד	
	ערסל		פיצול			

מזהה	שם פעילות	משך	2017											
			רבעון ראשון			רבעון שני			רבעון שלישי			רבעון רביעי		
			דצמ	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב
215	<u>אבן דרך שלב ה - השלמת עבודות גמר ומסירה סופית הרצה והפעלה לכלל הפרוייקט</u>	75 ימים												
216		50 ימים												
217	השלמת עבודות גיבון שתילה ונטיעות (התקנת ראשי מערכת, שתילת עצים וצמחיה)	14 ימים												
218	השלמת עבודות פיתוח סופי (ריהוט חוץ, ספסלים, אשפתונים, עמודי מחסום, סריגים, ברזיה, מתקני אופניים)	7 ימים												
219	התקנת מוצרי נגישות, שלטים, אלמנטים, ושילטי רחובות מוארים	5 ימים												
220	בדות עיצובי תאורה מיוחדים, אירועים, אשפתונים, עמודי מחסום.	5 ימים												
221	מתקני אופניים להשכרה	4 ימים												
222	מערכת " בולרדים " פניאומטיים	2 ימים												
223	ביצוע עבודות רמזורם על ציודם כולל שידרוג צמתים בגל הירוק	10 ימים												
224	ביצוע מצלמות על צידיהם	5 ימים												
225	שילוט רחובות מואר	3 ימים												
226	ביצוע עבודות מעברי חצייה מרוצפים בכבישים	10 ימים												
227	ביצוע עבודות אספלט שכבה אחרונה בכבישים לאחר קירצוף וריבוד.	7 ימים												
228	ביצוע אספלט שכבה אחרונה בשבילי אופניים	3 ימים												
229	עבודות תימרוצביעה וניתוב סופי	2 ימים												
230	ביצוע והפעלת רמזורים גלאיים וגל ירוק לכלל הפרוייקט מול בקרת רמזורים.	2 ימים												
231	קבלת אישור להרצת מערכות לפני טופס 4	2 ימים												
232	ביצוע סימולציה ואינטגרציה והרצה של מערכות המזרקה והכיכר כולל ניהול אירועים	14 ימים												
233	ביצוע השלמת כל הדרוש למזרקה והפעלת המתקן	4 ימים												
234	קבלת טופס 4 לאחר אישור כל גורמי החוץ, חח"י בטיחות, בריאות, שפ"ע מאור בטיחות, משרד הכלכלה, איה"ס, רישוי, אדר' העיר וכד'	20 ימים												
235	מסירת ציוד חליפי למחסני אגפי שפ"ע ודרכים לפי מפרט	3 ימים												
236	התקנת 2 מתקני שרותים עיליים אגף שפ"ע / תברואה	3 ימים												
237	<u>תהליך מסירת הפרוייקט נוהל עת"א</u>	17 ימים												
238	מסירה תאגיד מים ביוב	10 ימים												
239	מסירה לעיריה אגף תיעול ותאגיד - תיעול	5 ימים												
240	מסירה אגף תנועה	5 ימים												

זנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב ב נספח למכרז תאריך: 30/10/16	פעילות		פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות	
	פעילות קריטית		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרוייקט	
	התקדמות		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל	
	אבן דרך		התקדמות מסתכמת		תאריך יעד	
	ערסל		פיצול			

עמוד 9

